


# Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Prioriteetit, tavoitteet, keskeisimmät toimenpiteet  
ja milestonet

HYVÄKSYTTY YLEISKOKOUKSESSA 29.11.



## Prioriteetit 2024

- Opin.fi-palvelun kehitystyön ja pilotoinnin eteneminen suunnitellussa aikataulussa sekä toimivat kumppanuudet tärkeimpien kehityskumppaneiden kanssa
- Lanseerausvalmiuden rakentaminen: toiminnallinen, pedagoginen ja tekninen valmius
- Hankkeen ohjausmallin päivittäminen siten, että se palvelee tuotantovaihetta
- Jatkorahoituksen varmistaminen

## Tavoitteet 2024

1. Opin.fi:n beta-versio on avattu rajatusti oppijoille ja sitä kautta on saatu palautetta oikeilta oppijoilta.
2. Digivision palvelut ja ensimmäiset korkeakoulut ovat lanseerausvalmiudessa: toiminnallinen valmius ja tekninen valmius on saavutettu, laatukriteerit ovat käytössä.
3. Hankkeen seuraavan vaiheen tavoitteista on sovittu korkeakoulujen kesken ja toteutuksen valmistelu on käynnistetty. Hankkeen seuraavan vaiheen rahoitus on varmistettu.
4. Yhteistyö korkeakoulujen kesken, korkeakoulujen ja hanketoimiston kesken sekä kumppaneiden kanssa on sujuvaa ja tehokasta. Hankkeen ja yhtiön välinen ohjaus- ja toimintamalli on selkeä.



# Milestonet 2024

DIGIVISIO

MILESTONE	AIKATAULU	KORJATTU AIKATAULU	TILANNE	KOMMENTIT
Oppijat testaavat Opin.fi –palvelua testiympäristöissä tai testitunnuksin	Q1/24			
Yhtiön ja konsortion välinen ohjausmalli on sovittu	Q1/24			
Käyttöönottosuunnitelma on hyväksytty	Q1/24			
Lanseeraussuunnitelma on hyväksytty	Q2/24			
HigherEd Hub Finland Oy operatiivisessa valmiudessa	Q2/24			
Opin 2.0 tekninen tuotantoon siirtyminen	Q2/24			
Ensimmäisellä käyttöönottoryhmällä valmiudet tekniseen käyttöönottoon	Q2/24			
Päätös SMO palveluntarjoajasta	Q2/24			
Korkeakoulujen beta opin.fi käyttöönotto	Q3/24			
Oppijoiden beta-vaiheen rajattu käyttö alkaa	Q3/24			
Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus 2025–2028 valmiit	Q3/24			
Opin.fi brändin kevyt julkaisu	Q3/24			
Suunnitelma muutosohjelman vakiinnuttamisesta osaksi korkeakoulujen toimintaa on hyväksytty Yleiskokouksessa	Q3/24			
Opin 3.0 tekninen tuotantoon siirtyminen	Q4/24			

# Opin.fi-palvelun kokonaisaikataulu 2024

Oikeushenkilö  
operatiivisesti  
toiminnassa

Q1/2024

Q2/2024

Q3/2024

Q4/2024

Q1/2025

2.0 versio  
valmistuu

2.0 tuotanto-  
ympäristöissä

3.0 versio  
valmistuu

3.0 tuotanto-  
ympäristöissä

Tuotekehitys 2.0

Tuotekehitys 3.0 + korjaukset 2.0

Tuotekehitys 3.0

Tuotekehitys 4.0 + korjaukset 3.0

Tuotekehitys 4.0

2.0 pilotointi

3.0 pilotointi

Testaus 2.0:  
hyväksymistestaus +  
auditoinnit

Testaus 3.0:  
hyväksymistesta-  
us + auditoinnit

Tuotantoon  
siirtyminen  
2.0

Beta opin.fi tekninen käyttöönotto

Tuotantoon  
siirtyminen  
3.0

Opin.fi (3.0) tekninen käyttöönotto

Beta opin.fi rajattu käyttö tuotantoympäristössä  
pilottikorkeakoulut (optio 1.0, 2.0)

Opin.fi (3.0) tuotantoympäristössä

Käyttöönotto muut kuin pilottikorkeakoulut

Beta viestintä- ja markkinointi rajatuille kohderyhmille

Lanseerausviestintä ja  
markkinointi potentiaalisille  
kohderyhmille

# Keskeiset päätökset 2024

## Suunnitelma

DIGIVISIO

Q1

Q2

Q3

Q4

2023 raportoinnin  
hyväksyminen

Hankkeen uutta  
tuotantovaihetta palvelevan  
ohjausmallin hyväksyminen

Käyttöönotto- ja beta-vaiheen  
viestintä- ja  
markkinointisuunnitelman  
hyväksyminen

Opin.fi -palvelun  
koulutustarjonnan teemojen  
hyväksyminen

Yhteisrekisterinpitäjyyttä  
koskevan sopimuksen  
hyväksyminen

Opin.fi -palvelun tuotevision ja  
palvelulupauksen  
hyväksyminen

2.0 osajulkaisun tuotantoon  
siirron hyväksyminen

Tukipalvelun  
hankintapäätöksen  
hyväksyminen

Beta-käytön aloituksen  
hyväksyminen

Pelissäännöt 2.0  
hyväksyminen

Palveluintegraattorin valinta  
tuotantovaiheeseen

Päivitetyn tavoiteskenaarion  
hyväksyminen

Beta-vaiheen viestintä- ja  
markkinointisuunnitelman  
hyväksyminen

Hankkeen seuraavan vaiheen  
hankesuunnitelman  
hyväksyminen

Hankkeen seuraavan vaiheen  
rahoitushakemuksen/  
hakemusten hyväksyminen

Päivitetyn riskianalyysin  
hyväksyminen

3.0 osajulkaisun tuotantoon  
siirron hyväksyminen

Pelissäännöt 3.0  
hyväksyminen

Lanseeraussuunnitelman  
hyväksyminen


2025 toimintasuunnitelman  
hyväksyminen



# TIEKARTTA 2021–2026

- ✓ Oppijoiden osallistaminen tiivistä
- ✓ Tavoitearkkitehtuuri kuvattu ja käsitelmä laadittu
- ✓ Digivisio 2030 palvelujen toteutus käynnistetty ja keskeiset integraatiot määritelty
- ✓ Identiteetinhallinnan MVP proto valmis
- ✓ Jatkuviin palveluihin liittyvät linjaukset ja päätökset tehty
- ✓ Palvelujen käyttöönottomalli määritelty
- ✓ Ekosysteemimalli kuvattu
- ✓ Digipedagoginen yhteistyö: visio 2030 määritelty, kehittäjäverkostojen yhteistyö tiivistynyt, koulutukset käynnistetty, yhteisen tarjonnan pelisäännöt määritelty
- ✓ Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja yhteiset tulkinat
- ✓ Muutosjohtamisen ohjelma käynnistetty
- ✓ Kärkihankkeiden työ otettu osaksi hanketta valituilta osin
- ✓ Konsortion työskentely- ja päätöksentekomalli vakiintunut
- ✓ Sidosryhmäfoorumin toiminta vakiintunut
- ✓ Laadunhallinta osana kaikkea hankkeen toimintaa
- ✓ Hanketyössä tarvittavat työkalut käytössä

- Opin.fi:n beta-versio on avattu rajatusti oppijoille ja palvelusta on saatu palautetta, ensimmäiset tuotantoversiot lanseerattu ja jatkuvat palvelut toimivat korkeakoulujen määrittelemän palvelutason mukaisesti
- Opin.fi-palvelu ja ensimmäiset korkeakoulut ovat lanseerausvalmiudessa
  - Opin.fi-palvelun osajulkaisut 2.0 ja 3.0
  - Identiteetinhallinnan toteutus tuotantokäytössä
- Hankkeen jatkovaiheen teemat on tarkennettu ja jatkorahoitus on varmistettu
- Pienet osaamiskokonaisuudet osana 3.0 version pilotointia
- Digivisio-oikeushenkilö on operatiivisessa toimintavalmiudessa
  - Yhtiön ja konsortion yhteistyöstä ja tehtävistä on sovittu
- Virta-selvitykseen osallistuminen

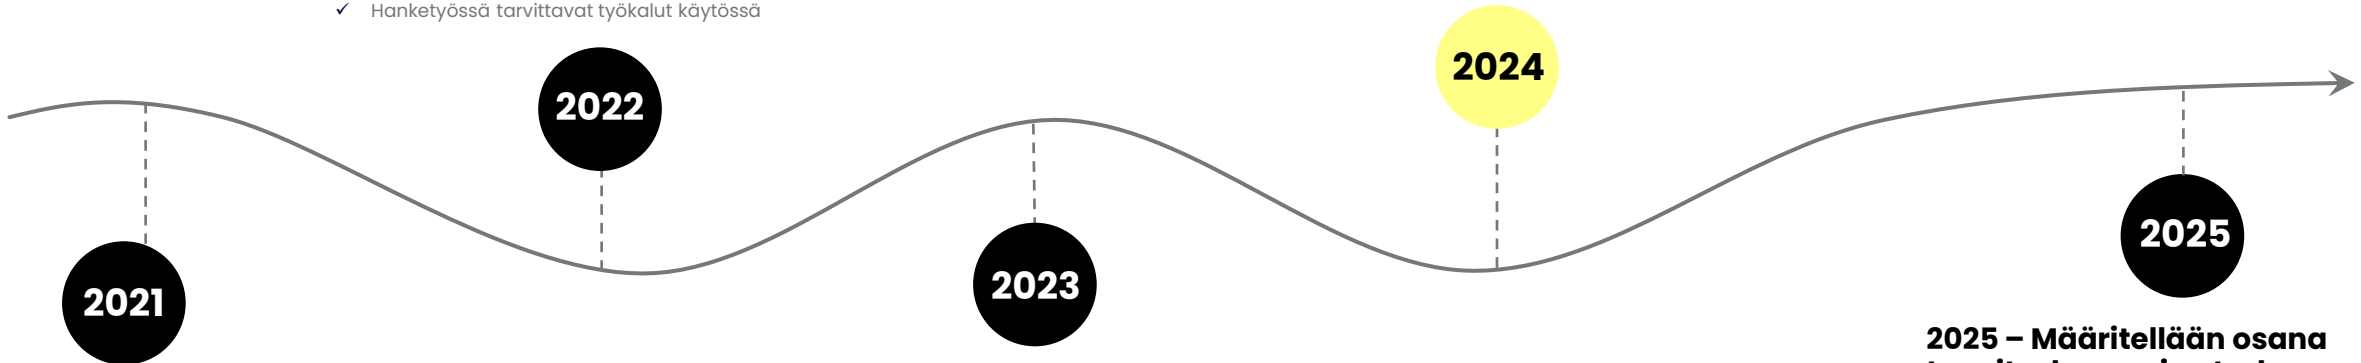

- ✓ Oppijan käyttäjätmatka kuvattu
- ✓ Tavoitearkkitehtuuri kuvattu
- ✓ Lainsäädännön muutostarpeet tunnistettu
- ✓ Nykyhankkeet ja järjestelmät analysoitu
- ✓ Digivisio 2030 palvelujen toiminnalliset määrittelyt tehty
- ✓ Digivisio 2030 kaksi ensimmäistä rajattua käyttöönottoa päätetty
- ✓ Oikeushenkilöselvityksen perusteella tarvittavat toimenpiteet linjattu
- ✓ Korkeakoulut ja OKM sitoutuneet yhteiseen visioon
- ✓ Rahoitus, hanke ja resurssointi suunniteltu
- ✓ Kehittämis- ja johtamismalli kiinnitetty

- ✓ Digivisio 2030 -palvelujen ensimmäiset tuotantoversiot lanseerattu ja jatkuvat palvelut toimivat korkeakoulujen määrittelemän palvelutason mukaisesti
  - ✓ Identiteetinhallinnan minimi toteutus pilotoitu pilottikorkeakouluissa (2023)
  - ✓ Opin.fi-palvelun osajulkaisu 1.0 (2023) ja pelisäännöt
- ✓ Opin.fi-palvelu sisältää korkeakoulujen yhdessä tuottamia kokonaisuuksia
- ✓ Linjaukset koulutustarjonnan ja koulutukseen hakemisen toimintoista suhteessa korkeakoulujen järjestelmiin on tehty
- ✓ Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt käytössä korkeakoulujen yhteisessä tarjonnassa
- ✓ Hyödynnetään modulaarisuutta tarkoituksenmukaisesti ja oppijan opintopolkua tukien yhteisessä opintotarjonnassa.
- ✓ Muutosjohtamisen ohjelma tarjoaa tukea Digivisio 2030 palvelujen käyttöönotoissa ja korkeakoulujen muutostyössä ja tarjoaa vertaisverkostoitumisen kautta tukea korkeakouluille
- ✓ Oppimisalustayhteistyöhön liittyvät linjaukset tehty
- ✓ Hankkeen jatkorahoituksen ja jatkuvan palvelujen rahoituksen suunnitelma valmis
- ✓ Konsortion pitkän aikavälin organisoituminen ratkaistu oikeushenkilön kautta

## 2025 – Määritellään osana tavoiteskenaariota tarkennusta

- Opintotarjonta ja oppijatieto yhdessä paikassa
- Sujuvat prosessit ja palvelut jalkautuneet
- Opin.fi-palvelun datan avulla merkittävää lisäarvoa oppijalle ja korkeakoululle
- Tutkinto-opiskelun asteittainen ottaminen mukaan Opin.fi tarjontaan
