

Verksamhetsplan för år 2024

Prioriteringar, mål, nyckelåtgärder och milstolpar

GODKÄND AV GENERALMÖTET 29.11



Prioriteringar 2024

- Utveckling och pilottestning av tjänsten Opin.fi fortskrider enligt den planerade tidtabellen samt fungerande partnerskap med viktiga utvecklingspartner
- Uppbyggnad av beredskap för lansering: funktionell, pedagogisk och teknisk beredskap
- Uppdatering av projektstyrningsmodellen för produktionsfasen
- Säkerställande av framtida finansiering

Mål 2024

1. Betaversionen av Opin.fi har öppnats för ett begränsat antal lärande och feedback från verkliga lärande har mottagits.
2. Digivisios tjänster och de första högskolorna är redo för lansering: operativ och teknisk beredskap har uppnåtts, kvalitetskriterierna tillämpas.
3. Målen för nästa fas av projektet har överenskommit mellan högskolorna och förberedelserna för genomförandet har inletts. Finansieringen för nästa fas av projektet har säkrats.
4. Samarbetet mellan högskolorna, mellan högskolorna och projektbyrån samt med partnererna är smidigt och effektivt. Det finns en tydlig styrnings- och verksamhetsmodell mellan projektet och bolaget.



Milstolpar 2024

MILSTOLPE	TIDTABELL	KORRIGERAD TIDTABELL	SITUATION	KOMMENTARER
De lärande testar Opin.fi i testmiljöer eller med test-ID:n	Q1/24			
Styrningsmodellen mellan bolaget och konsortiet har överenskommit	Q1/24			
Driftplanen har godkänts	Q1/24			
Lanseringsplanen har godkänts	Q2/24			
HigherEd Hub Finland Oy är i operativ beredskap	Q2/24			
Övergång till teknisk produktion av Opin.fi 2.0	Q2/24			
Första gruppen redo för teknisk driftsättning	Q2/24			
Beslut om leverantör av SMO-tjänster	Q2/24			
Införande av beta Opin.fi vid högskolorna	Q3/24			
Begränsad användning av de lärandes betafas börjar	Q3/24			
Projektplan och finansieringsansökan 2025-2028 klar	Q3/24			
Lätt publikation av varumärket Opin.fi	Q3/24			
Planen för att införa förändringsplanen vid högskolorna har godkänts av Generalmötet	Q3/24			
Övergång till teknisk produktion av Opin.fi 3.0	Q4/24			

Övergripande tidtabell för Opin.fi år 2024

Juridisk person i
operativ
verksamhet

Q1/2024

Q2/2024

Q3/2024

Q4/2024

Q1/2025

version 2.0
blir färdig

2.0 i
produktionsmiljöer

version 3.0
blir färdig

3.0 i
produktionsmiljöer

Produktutveckling 2.0

Produktutveckling 3.0 +
korrigeringar 2.0

Produktutveckling 3.0

Produktutveckling 4.0 +
korrigeringar 3.0

Produktutveckling 4.0

2.0 pilotprojekt

3.0 pilotprojekt

Testning 2.0:
acceptanstest +
revisioner

Testning 3.0:
acceptanstest +
revisioner

Övergång till
produktion
2.0

Beta Opin.fi teknisk driftsättning

Övergång till
produktion
3.0

Opin.fi (3.0) teknisk driftsättning

Beta opin.fi begränsad användning i en produktionsmiljö
pilothögskolor(option 1.0, 2.0)

Opin.fi (3.0) i produktionsmiljö

Iförande av andra än pilothögskolor

Beta kommunikation och marknadsföring för begränsade
målgrupper

Lanseringskommunikation
och marknadsföring för
potentiella målgrupper

Nyckelåtgärder 2024

Plan

DIGIVISIO

Q1

Q2

Q3

Q4

Godkännande av 2023
rapportering

Godkännande av en
styrningsmodell för projektets
nya produktionsfas

Godkännande av
kommunikations- och
marknadsföringsplanen för
driftsättnings- och betafaserna

Godkännande av
utbildningsutbudet för Opn.fi

Godkännande av avtalet om
gemensamt register

Godkännande av Opn.fi:s
produktvision och servicelöfte

Godkännande av överföring
av delpublikation 2.0 till
produktion

Godkännande av beslut om
köp av stödtjänst

Godkännande att starta
betaanvändning

Godkännande av
handlingssätt 2.0

Val av tjänsteintegratör för
produktionsfasen

Godkännande av uppdaterat
målsenario

Godkännande av
kommunikations- och
marknadsföringsplanen för
betafasen

Godkännande av
projektplanen för nästa fas
av projektet

Godkännande av
finansieringsansökan/ansökn
ingarna för nästa fas av
projektet

Godkännande av
uppdaterad riskanalys

Godkännande av
överföring av
delpublikation 3.0 till
produktion

Godkännande av
handlingssätt 3.0


Godkännande av
lanseringsplanen

Godkännande av
verksamhetsplanen 2025

Färdplan 2021–2026

- ✓ Nära involvering av de lärande
- ✓ Målarkitekturen har beskrivits och konceptmodellen har tagits fram
- ✓ Genomförande av Digivisio 2030 tjänster har inletts och viktiga integrationer har definierats
- ✓ MVP-prototyp för identitetshantering är klar
- ✓ Riktlinjer och beslut som gäller fortlöpande tjänster har fattats
- ✓ Definierad modell för tjänstdistribution
- ✓ Ekosystemmodellen är beskriven
- ✓ Digipedagogiskt samarbete: vision 2030 definierad
- ✓ Samarbetet mellan utvecklar nätverken har intensifierats, utbildning har inletts, handlingssätten för det gemensamma utbudet har fastställts
- ✓ Behovet av lagändringar och gemensamma tolkningar främjas
- ✓ Program för förändringsledning har lanserats
- ✓ Spetsprojektets arbete införlivas i projektet på utvalda områden
- ✓ Konsortiets arbets- och beslutsmodell är etablerad
- ✓ Forum för intressenter är väl etablerat
- ✓ Kvalitetsstyrning som en del av all projektverksamhet
- ✓ Verktyg för projektarbete är i bruk

- Betaversionen av Opin.fi har öppnats för ett begränsat antal lärande för feedback. Första produktionsversionerna har lanserats och pågående tjänster fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
- Tjänsten Opin.fi och de första högskolorna är redo för lansering
 - Opin.fi delpublikationer 2.0 och 3.0
 - Implementering av identitetshantering i produktionsanvändning
- Teman för nästa fas av projektet har förfinats och ytterligare finansiering har säkrats
- Små kompetensenheter som del av pilotprojektet av version 3.0
- Digivisios juridiska person är i operativ beredskap
 - Samarbetet och uppgifterna för bolaget och konsortiet har överenskommit.
- Deltagande i Virta-studien

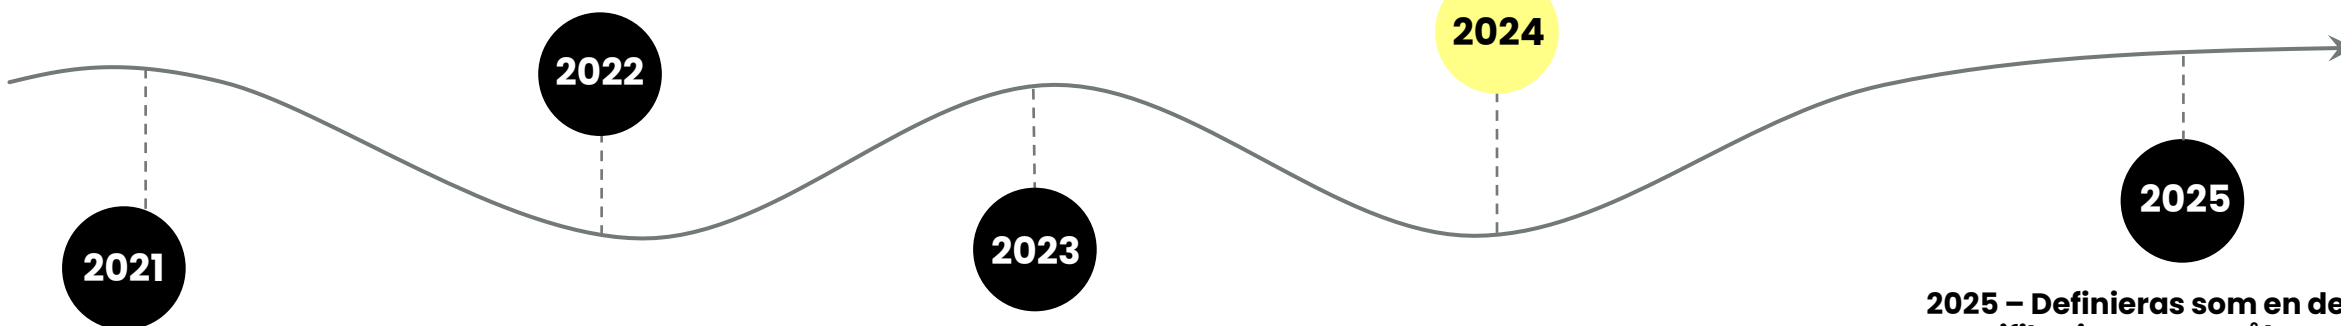

- ✓ Den lärandes färdplan är beskriven
- ✓ Målarkitekturen är beskriven
- ✓ Behov av lagändring är identifierat
- ✓ Aktuella projekt och system är analyserade
- ✓ Funktionella specifikationer för Digivisio 2030-tjänster är färdigställda
- ✓ Två första begränsade Digivisio 2030-lanseringar slutförda
- ✓ Åtgärder som vidtagits på grundval av undersökningen om den juridiska personen har redogjorts
- ✓ Högskolorna och UKM engagerade i en gemensam vision
- ✓ Finansiering, projekt och resurser planerade
- ✓ Beslutad modell för utveckling och ledning

- ✓ De första produktionsversionerna av Digivisio 2030-tjänsterna har lanserats och fortsätter att fungera i enlighet med den servicenivå som definierats av högskolorna.
 - ✓ Minimiimplementering av identitetshantering har testats vid pilothögskolor (2023)
 - ✓ Tjänsten Opin.fi:s delpublikation 1.0 (2023) och handlingssätt
- ✓ Tjänsten Opin.fi innehåller helheter som produceras gemensamt av högskolorna
- ✓ Riktlinjer har utarbetats för utbildningsutbudet och ansökan om utbildning i förhållande till högskolesystemen
- ✓ Digipedagogiska handlingssätt för gemensamma studier har införts för högskolornas gemensamma utbud.
- ✓ Modularitet används på lämpligt sätt och den lärandes lärandeväg stöds av ett gemensamt studieutbud.
- ✓ Programmet för förändringsledning ger stöd för genomförandet av Digivisio 2030-tjänster och för förändringsledning vid högskolorna samt erbjuder kollegialt stöd till högskolorna.
- ✓ Riktlinjer för samarbete på lärplattformar har utarbetats
- ✓ Plan för fortsatt finansiering av projektet och löpande tjänster är färdig
- ✓ Långsiktig organisation av konsortiet löst genom en juridisk person

2025 – Definieras som en del av specifikationen av målscenariot

- Studieutbud och lärandedata på ett och samma ställe
- Smidiga processer och tjänster är etablerade
- Opin.fi data ger ett betydande mervärde för de lärande och högskolorna
- Gradvis integrering av examensstudier i utbudet av Opin.fi
